ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДЫБЕНКО 8 2-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
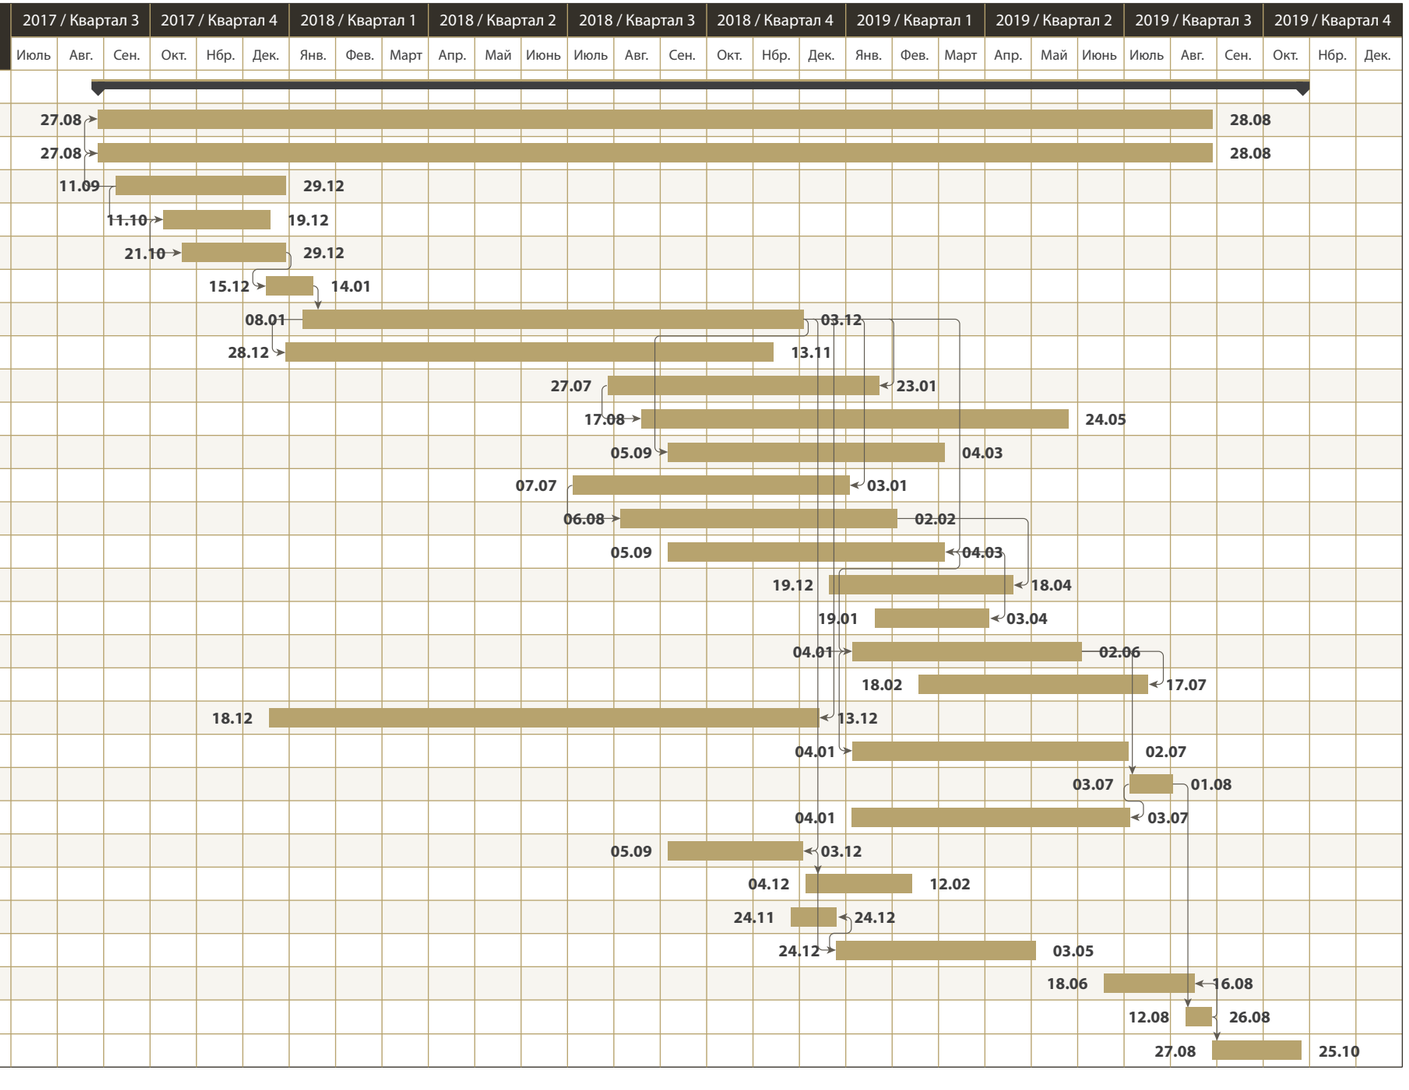
Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	Предшественники
1	**ЖК Ренессанс, 2-я очередь**	**Вс 27.08.17**	**Пт 25.10.19**	
2	Организация строительной площадки	Вс 27.08.17	Ср 28.08.19	3НН
3	Прочие работы	Вс 27.08.17	Ср 28.08.19	4НН-15 дней
4	Нулевой цикл, шпунт	Пн 11.09.17	Пт 29.12.17	
5	Устройство фундаментной плиты	Ср 11.10.17	Вт 19.12.17	4НН+30 дней
6	Устройство монолитного ж/б каркаса. Нулевой цикл	Сб 21.10.17	Пт 29.12.17	5НН+10 дней
7	Устройство сборно-монолитного ж/б каркаса. Этаж 1	Пт 15.12.17	Вс 14.01.18	6ОН-15 дней
8	Устройство сборно-монолитного ж/б каркаса. Этаж 2-23	Пн 08.01.18	Пн 03.12.18	7ОН-7 дней
9	Сборные элементы	Чт 28.12.17	Вт 13.11.18	8НН-10 дней
10	Наружные стены	Пт 27.07.18	Ср 23.01.19	8ОО+50 дней
11	Фасадные работы	Пт 17.08.18	Пт 24.05.19	10НН+21 дней
12	Кровля, покрытия	Ср 05.09.18	Пн 04.03.19	8ОН-90 дней
13	Полы	Сб 07.07.18	Чт 03.01.19	8ОО+30 дней
14	Внутренние стены, перегородки	Пн 06.08.18	Сб 02.02.19	13НН+30 дней
15	Окна, витражи	Ср 05.09.18	Пн 04.03.19	8ОО+90 дней
16	Двери	Ср 19.12.18	Чт 18.04.19	14ОО+75 дней
17	Металлоконструкции	Сб 19.01.19	Ср 03.04.19	15ОО+30 дней
18	Отделочные работы (предчистовая и моп)	Пт 04.01.19	Вс 02.06.19	15ОН-60 дней
19	Отделочные работы (чистовая отделка квартир)	Пн 18.02.19	Ср 17.07.19	18ОО+45 дней
20	Внутренние инженерные сети: поэтажная разводка	Пн 18.12.17	Чт 13.12.18	8ОО+10 дней
21	Внутренние инженерные сети: оборудование	Пт 04.01.19	Вт 02.07.19	18НН
22	Внутренние инженерные сети: пусконаладка и сдача	Ср 03.07.19	Чт 01.08.19	18ОН+30 дней
23	Внутриплощадочные и наружные сети	Пт 04.01.19	Ср 03.07.19	22НО
24	Лифты: поставка	Ср 05.09.18	Пн 03.12.18	8ОО
25	Лифты: монтаж и пусконаладка	Пт 14.12.18	Вт 12.02.19	24ОН+10 дней
26	Наружные сети (подключение)/автономный источник	Сб 24.11.18	Пн 24.12.18	27НО
27	Обеспечение теплого контура здания	Пн 24.12.18	Пт 03.05.19	18НН-10 дней
28	Благоустройство	Вт 18.06.19	Пт 16.08.19	29ОО-10 дней
29	Подготовка объекта к сдаче	Пн 12.08.19	Пн 26.08.19	22ОН+10 дней
30	**Получение ЗОС и акта ввода**	Вт 27.08.19	Пт 25.10.19	29
